

阳城县群众身边增绿建设项目  
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业  
发展项目实施情况及绩效自评公开

阳城县园林绿化服务中心

2025年2月

# 阳城县群众身边增绿建设项目 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会 公益事业发展项目实施情况

## 一、彩票公益金支持项目及使用规模

生态环保公益事业项目——阳城县群众身边增绿建设项目。

本项目建设工程概算总投资约 2132.66 万元，其中：工程费用 1817.51 万元、工程建设其他费用 194.43 万元、预备费 120.72 万元。项目使用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，截至目前中央彩票公益金支出 1000 万元用于工程费。

## 二、执行情况及实际效果

项目主要包括左岸大道（口袋公园）即县人民医院至坡底段绿化品质提升长度约 700m，平均宽度约 20m，面积约 16400 m<sup>2</sup>；四馆一院绿化、亮化面积约 1800 m<sup>2</sup>。建设内容主要包括左岸大道（口袋公园）绿化工程、附属设施工程、铺装工程、亮化工程、喷灌工程等；四馆一院包括绿化工程、附属设施工程、亮化工程等。

人民医院至坡底段提出主要完成了入口标志，高度 12 米；建成了瞭望挑台，建筑面积约 320 平方米，钢筋混凝土

结构；完成了钢架人行桥、林荫阅读廊架、书卷廊架建设，均为钢框架结构；建成入口水景，结合书香阳城，在入口处修建了入口水景，建筑占地面积 44.16 平方米，结构类型为钢筋混凝土，目前已基本完成。绿化方面，完成栽植面积约 8000 平米，注重生态配置，坚持物种多样性，栽植红叶鸡爪槭、金叶槐、卫矛球、绚丽海棠、红叶李等乔灌木，栽种美女樱、红色妖姬、蓝花鼠尾草等地被；铺装方面，完成塑胶跑道，彩色透水混凝土路面，约 3300 平米，便于市民出行需要；亮化方面，注重照明功能与艺术的有机结合，满足了市民夜间休闲需求；完成喷灌建设，注重雨水回收利用。四馆一院周边提升包括绿化工程、附属设施工程、亮化工程等。

本项目的实施对改善阳城县区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将起到积极的推动作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础。

附件一：阳城县群众身边增绿建设项目实景图

附件二：阳城县群众身边增绿建设项目工程中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2024 年度绩效自评报告

# 附件一：阳城县群众身边增绿建设项目实景图

## 1、 入口标志







## 2、入口水景



## 3、瞭望挑台

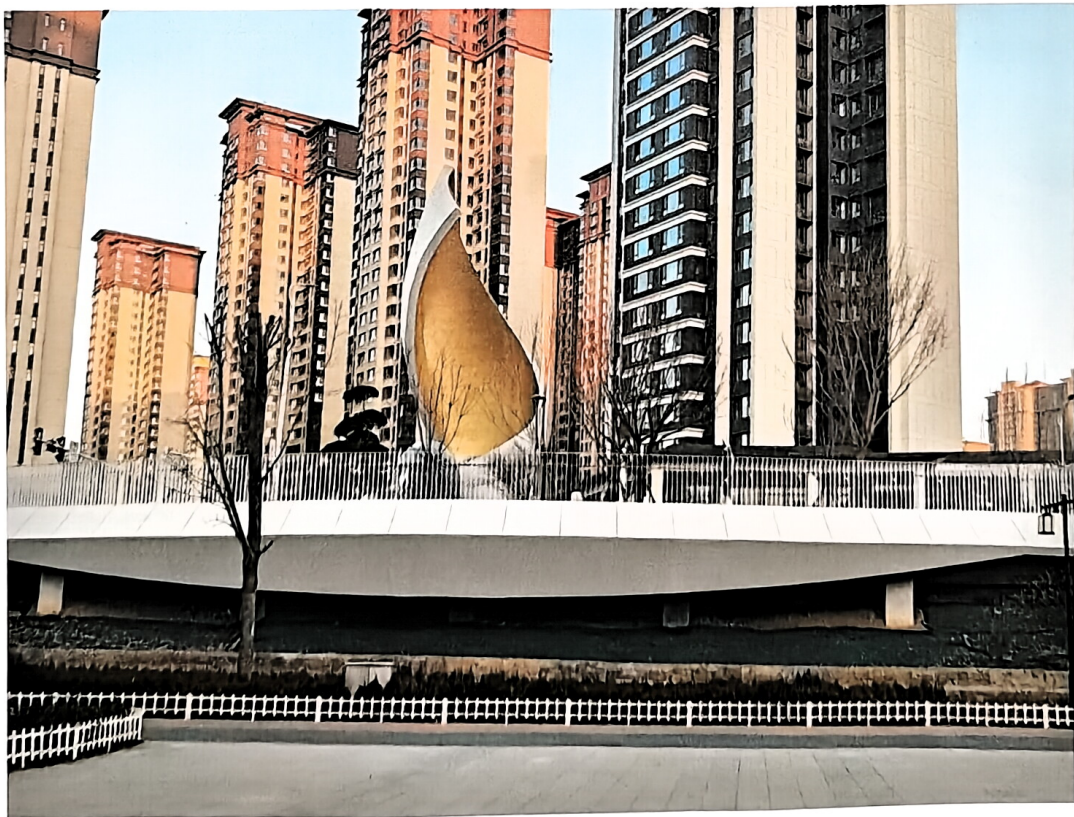



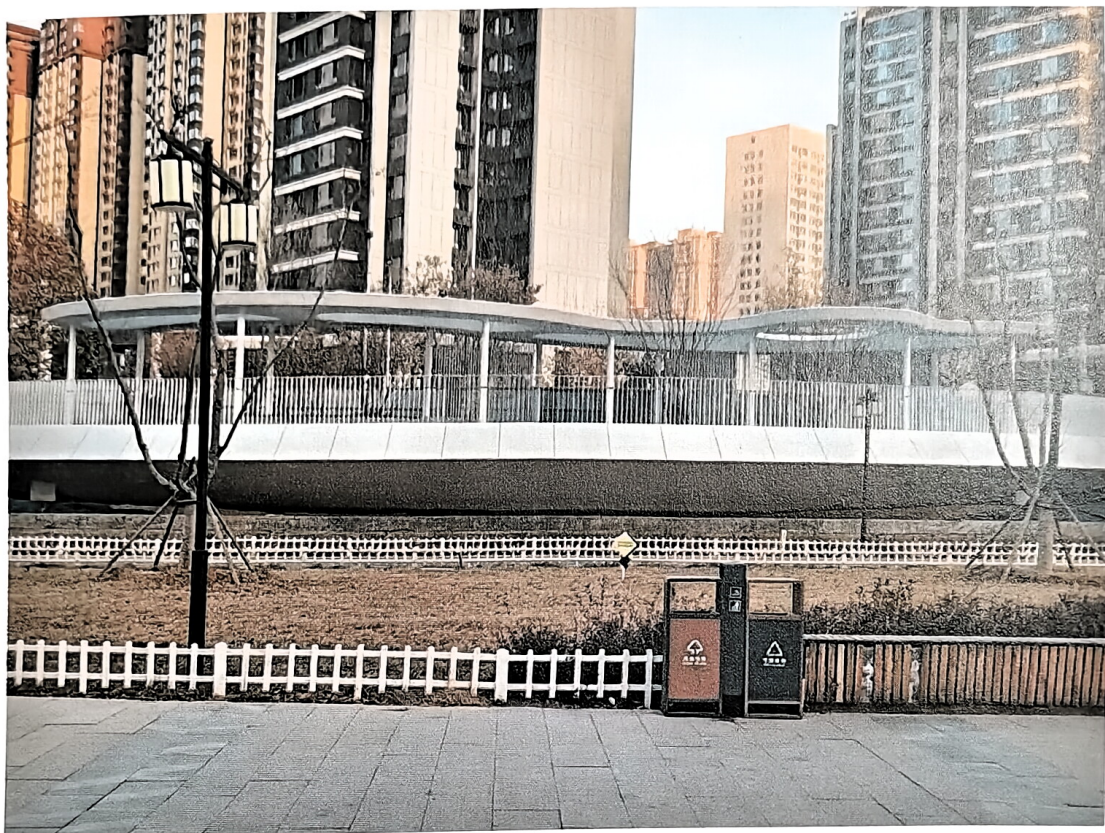

#### 4、林荫阅读廊架







## 5、钢架人行桥







附件二：阳城县群众身边增绿建设项目中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2024 年度绩效自评报告

## 阳城县群众身边增绿建设项目 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2024 年度绩效自评报告

根据上级部门报送中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金绩效目标的要求，结合项目建设情况，现将阳城县群众身边增绿建设项目 2024 年度绩效自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

1、项目名称：生态环保公益事业项目——阳城县群众身边增绿建设项目。

2、项目概算：本项目建设工程概算总投资约 2132.66 万元，其中：工程费用 1817.51 万元、工程建设其他费用 194.43 万元、预备费 120.72 万元。项目使用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，截至目前中央彩票公益金支出 1000 万元全部用于本工程项目支出。

3、总体目标：本项目建成后对改善阳城县区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础；为完善阳城县投资环境、带动经济发

展提供良好的条件，能发挥较好的社会和经济效益。

4、具体目标:本项目不涉及新增用地，项目主要包括左岸大道（口袋公园）即县人民医院至坡底段绿化品质提升长度约 700m，平均宽度约 20m，面积约 16400 m<sup>2</sup>；四馆一院绿化、亮化面积约 1800 m<sup>2</sup>。建设内容主要包括左岸大道（口袋公园）绿化工程、附属设施工程、铺装工程、亮化工程、喷灌工程等；四馆一院包括绿化工程、附属工程、亮化工程等。

5、组织实施情况：本项目是县政府 2024 年民生重点工程之一，项目筹备以来，我单位高度重视，召开专门的项目推进会，成立了项目领导小组和专门的办公室。单位一把手项目领导小组任组长，中心副主任担任项目负责人。项目办公室由规划股负责人担任，具体负责办理项目手续审批、招投标管理、工程进度督促等。从 2024 年 4 月项目开始实施以来，多次召开项目促进会，了解实际情况，实地解决问题，监督工程质量，督促工程进度，确保项目按要求高质量推进。截至 2024 年底，已完成整体进度的 95%以上，完成投资额约 1625.89 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，经初步验收，本项目完成投资约 1625.89 万元，其中：工程

费用约 1449.6 万元、工程建设其他费用 176.29 万元。项目使用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，截至 2024 年底中央彩票公益金支出 1000 万元全部用于本工程项目支出。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

完成建设绿化工程、附属设施工程、铺装工程、亮化工程、喷灌工程等。项目规划实施内容全部完成。

## （三）绩效指标完成情况分析

该项目建设内容主要包括入口标志、入口水景、瞭望挑台、钢架人行桥、林荫阅读廊架、书卷廊架、附属绿化、铺装、亮化、喷灌等工程，目前该项目完成投资约 1625.89 万元。

完成了入口标志，高度 12 米；建成了瞭望挑台，建筑面积约 320 平方米，钢筋混凝土结构；完成了钢架人行桥、林荫阅读廊架、书卷廊架建设，均为钢框架结构；建成入口水景，结合书香阳城，在入口处修建了入口水景，建筑占地面积 44.16 平方米，结构类型为钢筋混凝土，目前已基本完成。绿化方面，完成栽植面积约 8000 平米，注重生态配置，坚持物种多样性，栽植红叶鸡爪槭、金叶槐、卫矛球、绚丽海棠、红叶李等乔灌木，栽种美女樱、红色妖姬、蓝花鼠尾草等地被；铺装方面，完成塑胶跑道，彩色透水混凝土路面，约 3300 平米，便于市民出行需要；亮化方面，注重功能照

明与设施照明的有机结合，满足了市民夜间休闲需求；完成喷灌建设，注重雨水回收利用。四馆一院周边提升包括绿化工程、附属工程、亮化工程等。

（四）社会效益。目前项目总体尚未完工，为增加群众参与度，了解社会反应，经研究在农历新年前将已完工的瞭望挑台、钢架人行桥、林荫阅读廊架、书卷廊架等适合向社会开放的部分设施对社会进行了开放。沿河漫步，观光休闲，步移景异，处处欢声笑语，对宣传阳城书香文化起到了积极的社会效果，受到了居民群众的广泛好评。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标未偏离

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照有关要求，将绩效自评结果公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

阳城县园林绿化服务中心

2025年2月

